

BELMET

ERP 2026

07/07/2026 · Migration réalisée fin 2025 · horizon projet été 2027

DOCUMENT DE TRAVAIL

EN BREF

- Refonte du SI de gestion de **Belmet** en **architecture modulaire**, par étapes maîtrisées.
- Migration **V6R1 vers V7R5** réalisée en production (nov. 2025).
- Cahier des charges v1 reçu ; version **définitive** à figer.
- Jalons : **maquette fin décembre, validation client janvier, mise en service été 2027.**

21

MODULES DE DÉVELOPPEMENT

8 domaines gescom + 2 interfaces (CC v1)

ÉTABLI PAR

Nicolas Durand

Chef de projet (MOE) · Armonie Group

ESCALADE

Guy Routier

PDG · Armonie Group

DONNEUR D'ORDRE

Jonathan Lancelot

DSI Groupe Bellion · A/R

SOMMAIRE

Sommaire

Les sections du dossier.

01	Contexte et enjeu	3
02	Démarche de conception	4
03	Architecture fonctionnelle (CC v1)	4
04	Modèle de flux cible	5
05	Travaux réalisés · juin 2026	6
06	GANTT du projet	7
07	Séquencement et dépendances	8
08	Organisation et rôles	9
09	Contributions de l'équipe	10
10	Points à cadrer	11
11	Perspectives · travaux de l'été	11
12	Conclusion	11

Référence	ARMONIE-BEL-ERP26-DOSSIER-2026-07-07 · Confidentiel
Client / Projet	Groupe Bellion / Belmet : ERP 2026, refonte du SI de gestion
Objet	Cadrage, architecture modulaire, séquençement et organisation du projet
Charge juin 2026	128 h 30 · 5 intervenants (phase préparatoire)
Établi par	Nicolas Durand (MOE)
Date	7 juillet 2026
Statut	Document de travail, à valider en équipe

— CONTEXTE

Contexte et enjeu

Pourquoi une architecture modulaire.

La refonte du SI de gestion de **Belmet** (ERP 2026) vise à remplacer le système actuel par une solution durable et évolutive, construite par étapes maîtrisées.

Une **première tentative de modernisation n'a pas abouti** : faute de mise en production pérenne, l'entreprise est revenue à son ancien ERP. Ce système n'est plus maintenable dans de bonnes conditions de sécurité et de **conformité** (facturation électronique, traçabilité, RGPD).

Le client ne peut pas se projeter sur un système livré en bloc. D'où le choix d'une **architecture modulaire** : avancer par briques, valider une **maquette** avant de s'engager, ajuster sans tout refaire. C'est aussi la leçon du **projet précédent** : éviter le big-bang, viser une **solution pérenne**.

DÉMARCHE

Démarche de conception

De la migration technique à la conception par modules, par briques validées.

01 Migration technique préalable

- **Recette en environnement bac à sable** avant la migration, portée par **Léo Charrier**.
- **Passage en production** réalisé par **Lionel Kieffer** (week-end du 22/11/2025). Travaux complémentaires jusqu'en décembre 2025.


02 Conception du SI par modules

- **Cahier des charges (CC v1)** reçu : il définit l'ensemble des modules et sert de base à la conception ; le **cahier des charges définitif** conditionnera le développement.
- **Architecture modulaire et modulable** : 8 domaines gescom + 2 interfaces, déclinés en **21 modules** de développement.
- **Diagramme de flux** informatiques et métiers, et **description globale des process** qui alimente le **modèle de données**.

ARCHITECTURE

Architecture fonctionnelle (CC v1)

8 domaines de gestion commerciale + 2 interfaces (compta et logistique interfacées).



Le détail de chaque module (contenu, porteurs, dépendances, reprise) sera précisé au **CC définitif**. L'ensemble se décline en **21 modules** de développement (voir GANTT).

MODÈLE DE FLUX

Modèle de flux cible

Du besoin matière à la livraison client : comment la demande est servie.

HYPOTHÈSE DE TRAVAIL

Modèle de flux cible proposé, à confirmer au **cahier des charges définitif**. Ces paramètres ne sont pas encore sourcés côté Belmet.



Paramètres du flux

PARAMÈTRE	VALEUR
Type de flux	Sur stock (make-to-stock)
Point de découplage	Stock produit fini
Stock cible	500 unités / jour
Délai client promis	Immédiat

Gouvernance · qui décide quoi

DÉCISION	RESPONSABLE
Construit le forecast	Commerce
Valide le plan	S&OP mensuel
Peut modifier le stock cible	Supply Chain
Arbitre capacité vs demande	Direction (S&OP)

— TRAVAUX RÉALISÉS

Travaux réalisés · juin 2026

Phase préparatoire au lancement · nature et apport de chaque contribution.

128h30

CHARGE BELMET

Juin 2026 · 5 intervenants

5

INTERVENANTS

Selon leurs expertises

49 h

POSTE PRINCIPAL

Analyse fonct. et technique

Pilotage & coordination

Nicolas Durand · 35 h

Organisation et coordination des travaux, suivi des réunions et du cahier des charges, et création d'un MVP pour matérialiser la cible.

Analyse fonctionnelle & technique

Frédéric Dantz · 49 h

Analyse de la solution existante. Réalisation principale : un **outil d'analyse des journaux** qui recense les fichiers utilisés et suit les modifications de données, base pour la **conception** et la **reprise des données**.

Étude de l'existant

Léo Gualano · 29 h

Documentation de l'application et analyse de la base de données actuelle, avec Frédéric Dantz, pour cerner l'environnement et les points de vigilance ; participation aux réunions de lancement.

Cadrage

Léo Charrier (12 h) et Yann-André Roehrig (3 h 30)

Participation aux réunions de lancement et aux premières analyses ; apport d'expertise technique au cadrage.


EN PARALLÈLE · INFRASTRUCTURE AIME (IA) · THOMAS PRUVOST · 14 H

Initialisation de l'environnement et premiers tests techniques (plateforme dédiée à l'IA). Charge hors total BELMET, V0.1 provisoire à consolider.

— GANTT

GANTT du projet

Étapes, porteurs et jalons sur un seul calendrier (au mois).

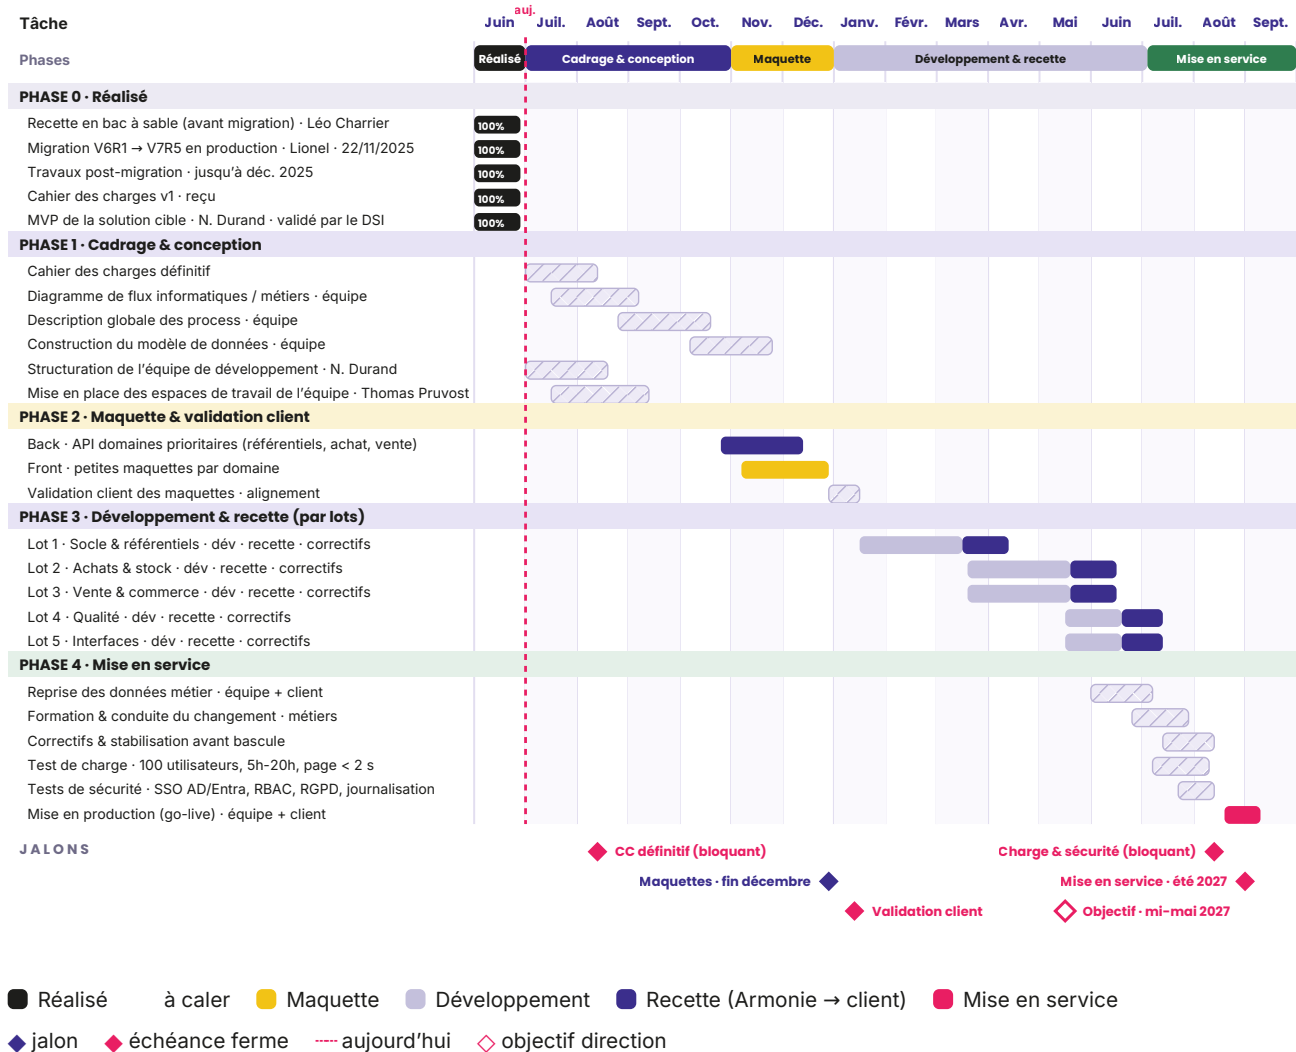

Découpage en lots · par cohérence fonctionnelle

Lot 1	Socle & référentiels	Clients · Fournisseurs · Articles
Lot 2	Achats & stock	Achat / Appro. · Gestion de stock
Lot 3	Vente & commerce	Vente / Commerce · SAV
Lot 4	Qualité	Qualité
Lot 5	Interfaces	Interface Caisse · Interface Comptable

Modules regroupés en **lots par cohérence fonctionnelle**. Le **Lot 1 (socle de référentiels)** est prioritaire : les autres lots s'appuient dessus.
Répartition définitive et priorités **figées au cahier des charges définitif**.

SÉQUENCEMENT

Séquencement et dépendances

L'enchaînement des étapes, leurs porteurs et leurs dépendances.

#	ÉTAPE	PORTEUR(S)	PRÉREQUIS	STATUT / JALON
1	Recette en bac à sable (avant migration)	Léo Charrier	—	Réalisé
2	Migration V6R1 vers V7R5 en production (22/11/2025)	Lionel Kieffer	Recette validée	Réalisé
3	Travaux post-migration	Lionel Kieffer	Migration en production	Réalisé · déc. 2025
4	Cahier des charges v1 (reçu)	Équipe + métiers	—	Réalisé
5	MVP de la solution cible (prototype) · N. Durand · validé par le DSI	N. Durand	CC v1	Réalisé
6	Cahier des charges définitif	Client + équipe	CC v1	Attendu
7	Diagramme de flux + description des process	Équipe	CC définitif	À faire
8	Construction du modèle de données	Équipe	Flux et process	À faire
9	Structuration de l'équipe de développement	N. Durand	CC définitif	À faire
10	Maquette proposée au client	Équipe	Modèle de données	Fin déc. 2026
11	Validation client de la maquette (alignement)	Client	Maquette	Janvier 2027
12	Développement par lots + recette (Armonie → client → retours)	Équipe dev + métiers	Validation maquette	Janv. à juin 2027
13	Test de charge · 100 utilisateurs simultanés, 5h-20h, page < 2 s	Équipe + client	Recette des lots	Avant bascule
14	Tests de sécurité · SSO AD/ Entra, RBAC, RGPD, journalisation	Équipe	Recette des lots	Avant bascule
15	Reprise des données, formation et mise en service	Équipe + client	Charge et sécurité validées	Été 2027

DÉPENDANCES CLÉS

Le calendrier tient à quelques dépendances fortes. Le **modèle de données** conditionne la conception des domaines ; **dès qu'un domaine est conçu, le développement de ses API démarre**, sans attendre la fin de toute la conception. Ces premières API alimentent la **maquette**, dont la **validation par le client** conditionne ensuite le **développement complet par lots** — le socle (Lot 1) d'abord, les autres s'appuyant dessus. Enfin, la **mise en service** n'a lieu qu'après deux **contrôles bloquants** : le test de charge et les tests de sécurité.

ORGANISATION

Organisation et rôles

Qui porte quoi sur le projet.

ACTEUR	RÔLE
Guy Routier	PDG Armonie · responsable côté Armonie.
Nicolas Durand	MOE · pilotage et coordination du projet.
Frédéric Dantz	Analyse fonctionnelle et technique.
Léo Gualano	Étude de l'existant.
Léo Charrier	Cadrage et réunions de lancement.
Yann-André Roehrig	Expertise technique.
Lionel Kieffer	Migration technique (V6R1 vers V7R5), développements IBM i.
Thomas Pruvost	Mise en place des espaces de travail de l'équipe (développement, tests) ; infrastructure AIME (IA, hors périmètre).
Jonathan Lancelot	DSI Groupe Bellion · donneur d'ordre côté client (A/R).
Bertrand Doury	Chef de projet ERP côté client (R).
Métiers Belmet	J. Andrieux (dir. PM), K. Treguer (dir. FI), Y. Jesus (DAF)...

ESCALADE Côté **Armonie**, le chef de projet rend compte à **Guy Routier** (PDG). Côté **client**, le donneur d'ordre est **Jonathan Lancelot** (DSI Groupe Bellion) ; les décisions qui le dépassent sont arbitrées par la direction générale (François Bellion, DG Belmet ; Antoine Bellion, DG Groupe).

CAPACITÉ DE DÉVELOPPEMENT Objectif de **trois développeurs à plein temps dès septembre** (Léo Charrier, Léo Gualano et Adrien Quillère) ; à défaut de Léo Charrier, deux profils autonomes. Les développements démarrent **domaine par domaine**, dès la conception de chacun.

CONTRIBUTIONS DE L'ÉQUIPE

Arbitrages en cours

Points soulevés par l'équipe, à trancher au cadrage.

Lionel Kieffer Lead développement IBM i

Enchaîner conception et développement, par domaine. Ne pas attendre la fin de toute la conception pour démarrer : dès qu'un domaine est conçu, enchaîner sur le **développement de ses API**. Côté back, livrer vite des API pour que le front monte la **maquette** — qui, en décembre, se concentrera sur les domaines **prioritaires (référentiels, achat et vente)**, pas sur tout le périmètre. Capacité visée : **trois développeurs à plein temps dès septembre** (les deux Léo et Adrien Quillère ; à défaut de Léo Charrier, deux profils autonomes). **Enchaînement, périmètre de la maquette et capacité à caler au cadrage.**

Yann-André Roehrig Expertise technique

Réalisme du calendrier et maquettes. Les durées envisagées restent courtes pour un ERP de 21 modules ; la parallélisation des lots est le principal levier pour absorber la charge sans sacrifier la qualité. Piste proposée : **plusieurs petites maquettes par domaine** plutôt qu'une seule maquette globale. **À arbitrer au cadrage.**

Guy Routier Direction

Objectif et méthode de production. Cible de mise en service mi-mai 2027. Méthode proposée : rythme jour/nuit assisté par IA (serveur AIME), développements lancés la nuit puis relecture et intégration le matin. **Cible tendue ; méthode à éprouver sur un périmètre pilote.**

CE QUI EN RESSORT

En clair : **construire en flux** — dès qu'un domaine est conçu, le back livre ses **API** et le front enchaîne la **maquette** de ce domaine (plusieurs petites maquettes). Capacité visée : **3 développeurs plein temps dès septembre**. La maquette de décembre cible les **domaines prioritaires** (référentiels, achat, vente). Et **prévoir le temps de correction** après chaque recette. Préalables : modèle de données prêt et cahier des charges définitif figé.

À CADRER

Points à cadrer

À arrêter en équipe avant la version définitive.

- **Réception du cahier des charges définitif** : préalable bloquant au lancement du développement.
- **Périmètre détaillé** des modules et interfaces (achat/appro, stock, qualité...) au CC définitif.
- **Dépendances** inter-étapes et inter-modules, et **affectation** des équipes.
- **Calage des dates** : modèle de données, conception, maquette (déc.), recette, reprise, formation et mise en service (été 2027).
- **Porteurs et dépendances** inter-modules à arrêter par lot.
- **Méthode de production** : valider le rythme **jour/nuit assisté par IA** (développements lancés la nuit, relecture et intégration le matin) et son outillage, d'abord sur un périmètre pilote. Orientation direction.
- **Capacité de développement** : trois développeurs à plein temps dès septembre (les deux Léo et Adrien Quillère) ; à défaut de Léo Charrier, deux profils autonomes.
- **Périmètre de la maquette de décembre** : domaines prioritaires (référentiels, achat/vente), pas l'ensemble du périmètre.

PERSPECTIVES

Travaux de l'été

Dans la continuité de la phase de préparation.

- **Analyse fonctionnelle** (Frédéric Dantz) : avancer sur l'étude du **cahier des charges**, préalable à la conception.
- **Projet BELMET** : sous réserve de la réception du CC, conception de la **nouvelle base de données** et validation des choix avec les équipes métiers.
- **Infrastructure AIME (IA)** : provisionnement de l'infrastructure, création des espaces de travail dédiés et automatisation du déploiement.

CONCLUSION

Une base de travail cadrée

Ce que fixe ce dossier.

Ce dossier fixe la **démarche modulaire**, le **séquençement** et l'**organisation** du projet **Belmet** (ERP 2026). Les points encore ouverts (périmètre détaillé des modules, dépendances, dates) seront arrêtés au **cahier des charges définitif** et en réunion d'équipe.

Prochaine étape : cadrage du CC v1 en équipe.
